Nordslettveien Velforening
Fremdriftsplan nedgraving containere avfallshåndtering 2026

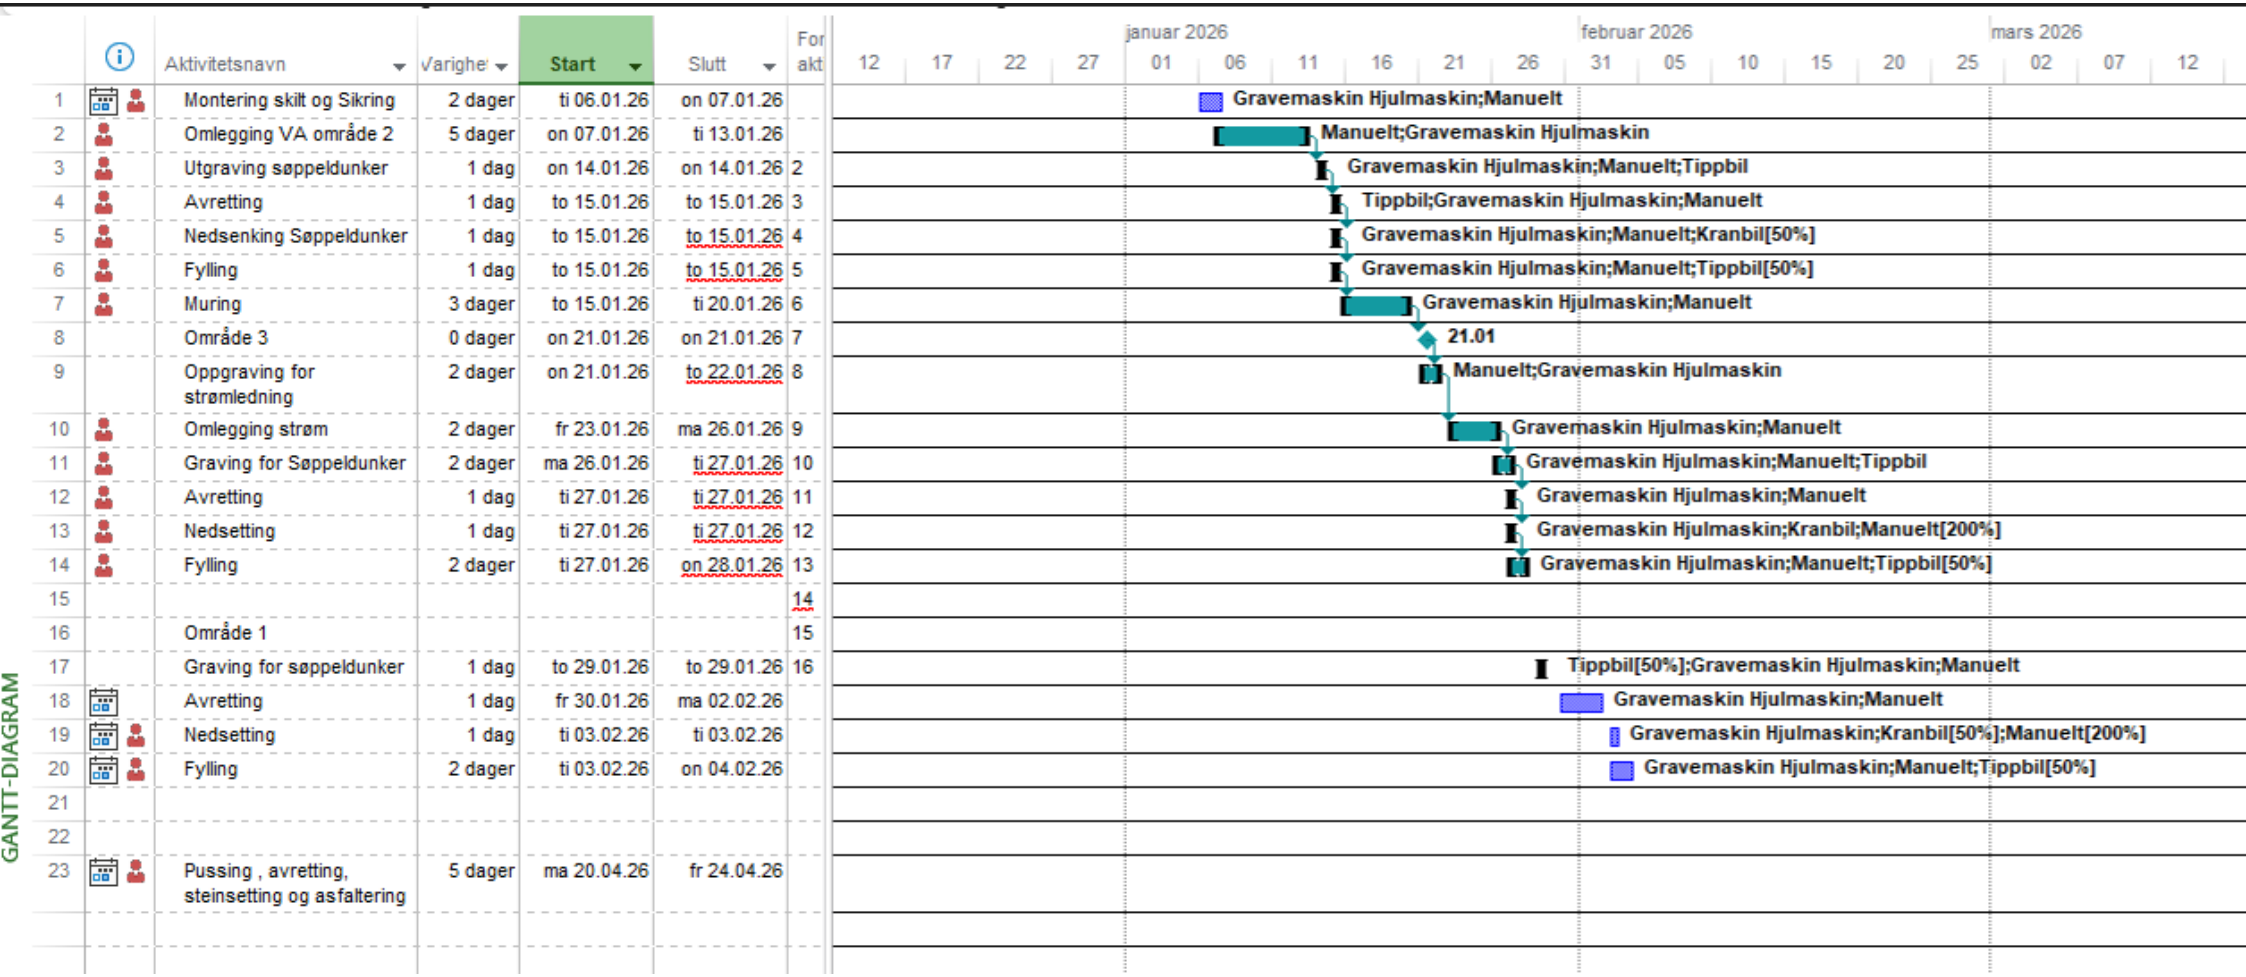

	Aktivitetsnavn	Varighe	Start	Slutt	For akt
1	Montering skilt og Sikring	2 dager	ti 06.01.26	on 07.01.26	
2	Omlegging VA område 2	5 dager	on 07.01.26	ti 13.01.26	
3	Utgraving søppeldunker	1 dag	on 14.01.26	on 14.01.26	2
4	Avretting	1 dag	to 15.01.26	to 15.01.26	3
5	Nedsenking Søppeldunker	1 dag	to 15.01.26	to 15.01.26	4
6	Fylling	1 dag	to 15.01.26	to 15.01.26	5
7	Muring	3 dager	to 15.01.26	ti 20.01.26	6
8	Område 3	0 dager	on 21.01.26	on 21.01.26	7
9	Oppgraving for strømledning	2 dager	on 21.01.26	to 22.01.26	8
10	Omlegging strøm	2 dager	fr 23.01.26	ma 26.01.26	9
11	Graving for Søppeldunker	2 dager	ma 26.01.26	ti 27.01.26	10
12	Avretting	1 dag	ti 27.01.26	ti 27.01.26	11
13	Nedsetting	1 dag	ti 27.01.26	ti 27.01.26	12
14	Fylling	2 dager	ti 27.01.26	on 28.01.26	13
15					14
16	Område 1				15
17	Graving for søppeldunker	1 dag	to 29.01.26	to 29.01.26	16
18	Avretting	1 dag	fr 30.01.26	ma 02.02.26	
19	Nedsetting	1 dag	ti 03.02.26	ti 03.02.26	
20	Fylling	2 dager	ti 03.02.26	on 04.02.26	
21					
22					
23	Pussing , avretting, steinsetting og asfaltering	5 dager	ma 20.04.26	fr 24.04.26	
